Vedlegg 1-1 3RWY OSL - Fremdriftsplan med lokaliseringsvalg

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet
1		**Lokaliseringsvalg OSL**	**480 dager**
2		Oppstart KU for lokaliseringsvalg	0 mndr
3		KU - underlag fra Avinor	6 mndr
4		KU - fra rådgiver, ink. oppdatert samfunnsøk. Analyse	12 mndr
5		KU - høring av program (SD)	6 mndr
6		KU - Høring (SD)	6 mndr
7		Oppdatering av teknisk og økonomisk underlag	12 mndr
8		Kvalitetssikring eksterne (KS1)	6 mndr
9		Lokaliseringvalg 3RWY prosess (SD)	6 mndr
10		Besluttning lokalisering 3RWY (SD)	0 dager
11		**Reguleringsplan**	**360 dager**
12		Reguleringsplan - prosess	18 mndr
13		Reguleringsplan - vedtak	0 dager
14		**Konsesjonssøknad**	**480 dager**
15		Konsesjonssøknad, inkl oppdatert støyforskrift	24 mndr
16		Vedtak konsesjon	0 dager
17		**Grunnerverv, forberedene arbeider**	**1254 dager**
18		Vedtak ekspropriasjon	0 dager
19		Støytiltak mm iht vedtatt reguleringspla	24 mndr
20		Grunnerverv	24 mndr
21		Kulturminner - frigivelse utbyggingsomr	12 mndr
22		**Planleggingsfase**	**540 dager**
23		Premisser/grunnlag 3RWY byggeprosjek	6 mndr
24		Forprosjekt	18 mndr
25		Kvalitetssikring eksterne (KS2)	6 mndr
26		Styrevedtak utbygging, Avinor	0 dager
27		**Gjennomføring**	**1640 dager**
28		Detaljprosjektering	18 mndr
29		Konkuranse, utlysning - kontrahering	18 mndr
30		Gjennomføring bygg&anleggsarbeider	46 mndr
31		Kompleterende arbeider og testing	30 mndr
32		Overlevering til drift, godkjenning/åpnir	6 mndr
33		Åpning 3RWY	0 dager

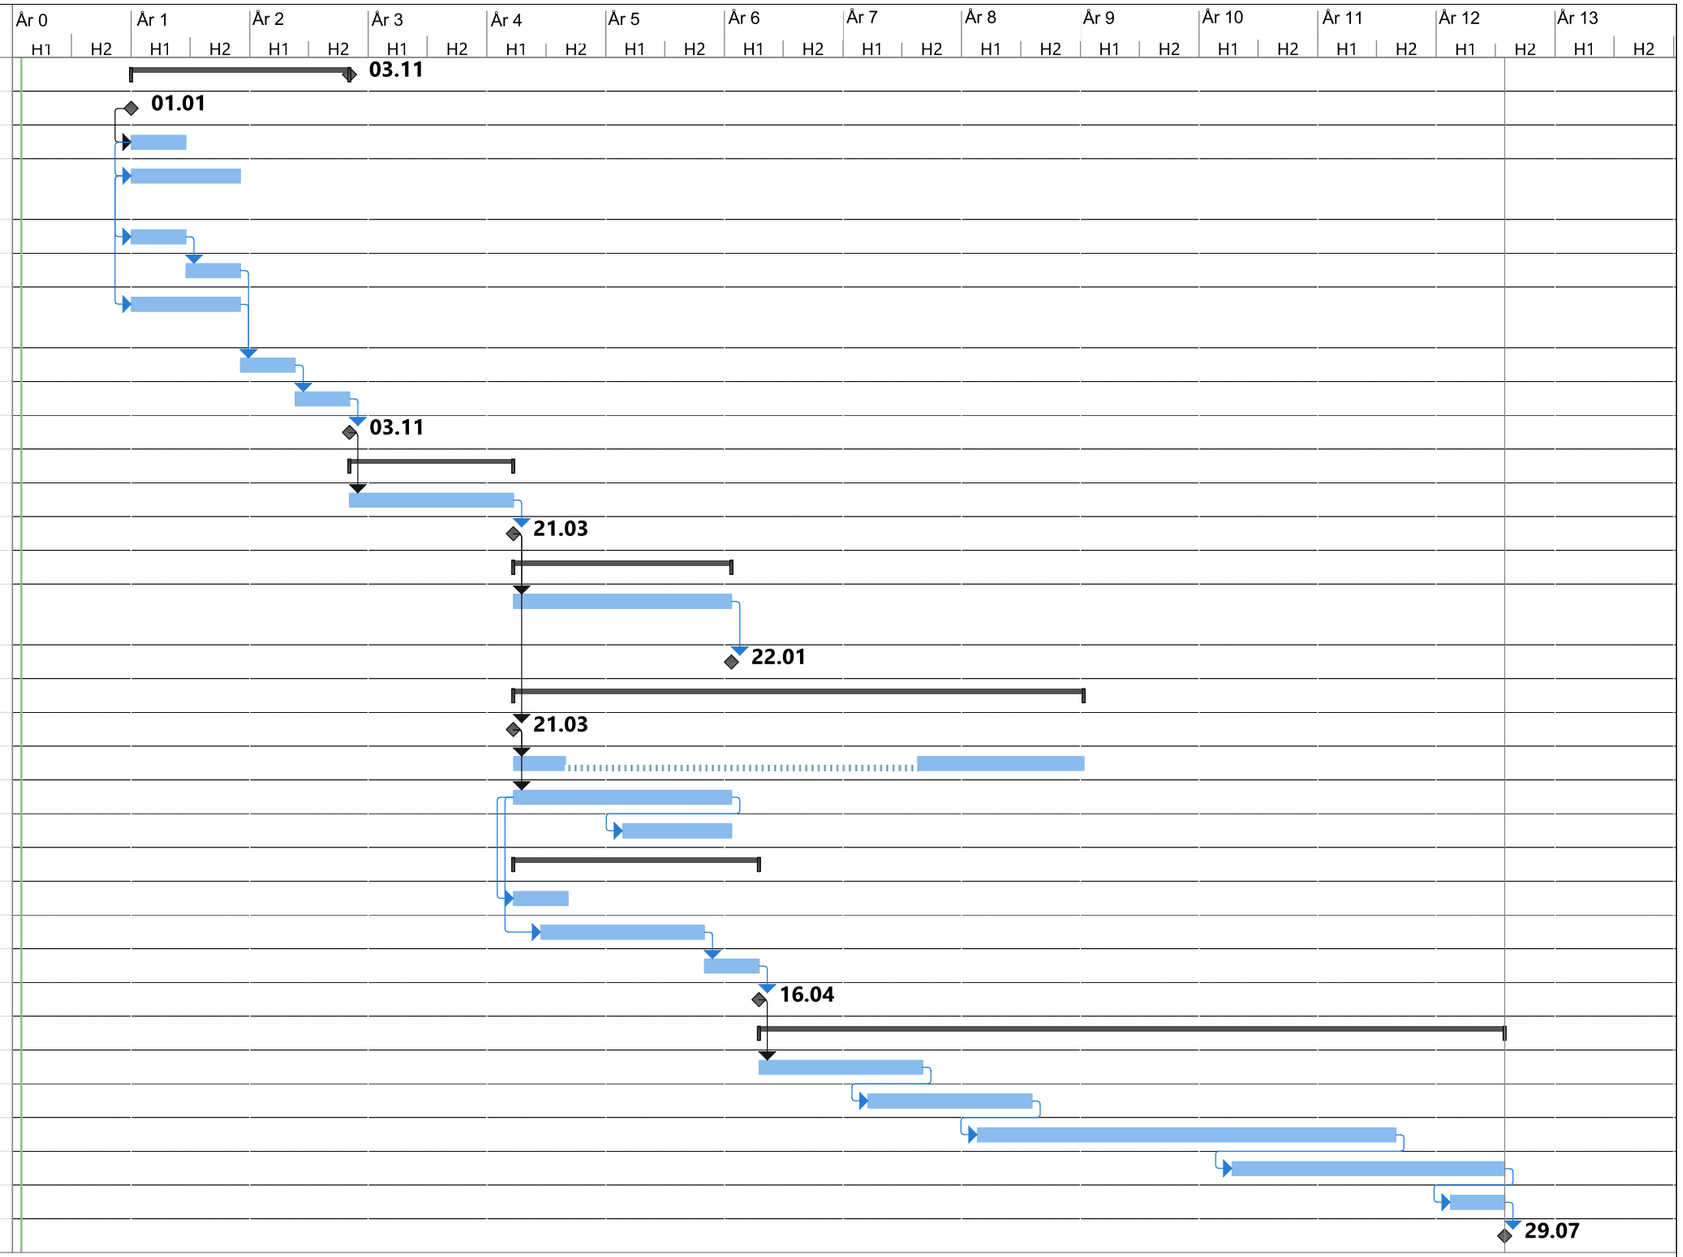

Prosjekt: Fremdriftsplan overord
Dato: ma 29.01.24

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	
